

No.	図面番号	質疑事項	回答
1	A01・09	堅樋工事は、どちらでしょうか？ご教示ください(①撤去及び銅製にて新設②塗装替え)。	A棟のみ撤去・新設、B・C・浴室棟は塗装替えでおねがいします。
2	同上	上記工事が、新設の場合、A棟のみの新設でしょうか？ご教示ください。	〃
3	A04・09	高圧水洗浄は、12MPa程度、8MPa程度、どちらでしょうか？ご教示ください。	高圧水洗浄は8MPa程度でおねがいします。
4	共通仮設	工事用仮設電力として、低騒音型D、Gを設置したいと考えていますが、設置場所は、資材置場部分で宜しいでしょうか？ご教示ください。	別途協議します。
5			
6			
7			


① 4 外壁補修工事について

塗膜除去(アスベスト含有箇所・アスベスト非含有箇所)について除去の厚さはどの程度の範囲で行えばよろしいでしょうか。



塗膜の浮き、剥がれ等劣化部に対する処置であるため、それぞれの箇所において付着力が逸している範囲までおねがいします。ちなみに除去する必要がなければ活膜は残していただいてもかまいません。

番号	質 問	番号	回 答																																																																												
1.	<p>(図番A-07)アスベスト含有吹付け材の除去対象は図示されている範囲のみと考えてよろしいでしょうか。また事前調査の結果、図示されていない範囲にアスベスト含有吹付け材が確認された場合は、別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>アスベスト含有調査結果は以下の表のとおりとなります。他の箇所にて含有が確認された場合は別途協議とします。</p> <table border="1" data-bbox="1025 379 2042 1086"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>建物</th> <th>部位</th> <th>材料</th> <th>吹付け</th> <th>含有率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>宿泊棟 (A棟)</td> <td>外階段</td> <td>天井</td> <td>リシン吹付</td> <td>含有 クリンタイト 0.9%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>宿泊棟 (A棟)</td> <td>外部</td> <td>外壁</td> <td>吹付タイル</td> <td>含有せず</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>宿泊棟 (A棟)</td> <td>外部</td> <td>外壁</td> <td>モルタルスタッコ</td> <td>含有 アクチノライト 0.1%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>宿泊棟 (B棟)</td> <td>外部</td> <td>外壁</td> <td>モルタルスタッコ</td> <td>含有 アクチノライト 0.1%</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>宿泊棟 (B棟)</td> <td>出窓</td> <td>外壁</td> <td>吹付タイル</td> <td>含有せず</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>宿泊棟 (B棟)</td> <td>出窓</td> <td>上裏</td> <td>吹付タイル</td> <td>含有せず</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>宿泊棟 (C棟)</td> <td>出窓</td> <td>壁</td> <td>吹付タイル</td> <td>含有せず</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>宿泊棟 (C棟)</td> <td>出窓</td> <td>上裏</td> <td>吹付タイル</td> <td>含有せず</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>宿泊棟 (C棟)</td> <td>外部</td> <td>外壁</td> <td>モルタルスタッコ</td> <td>含有 アクチノライト 0.1%</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>浴室棟</td> <td>外部</td> <td>外壁</td> <td>モルタルスタッコ</td> <td>含有 アクチノライト 0.1%</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>浴室棟</td> <td>外部</td> <td>外壁</td> <td>吹付タイル</td> <td>含有せず</td> </tr> </tbody> </table>					番号	建物	部位	材料	吹付け	含有率	7	宿泊棟 (A棟)	外階段	天井	リシン吹付	含有 クリンタイト 0.9%	8	宿泊棟 (A棟)	外部	外壁	吹付タイル	含有せず	9	宿泊棟 (A棟)	外部	外壁	モルタルスタッコ	含有 アクチノライト 0.1%	10	宿泊棟 (B棟)	外部	外壁	モルタルスタッコ	含有 アクチノライト 0.1%	11	宿泊棟 (B棟)	出窓	外壁	吹付タイル	含有せず	12	宿泊棟 (B棟)	出窓	上裏	吹付タイル	含有せず	13	宿泊棟 (C棟)	出窓	壁	吹付タイル	含有せず	14	宿泊棟 (C棟)	出窓	上裏	吹付タイル	含有せず	15	宿泊棟 (C棟)	外部	外壁	モルタルスタッコ	含有 アクチノライト 0.1%	16	浴室棟	外部	外壁	モルタルスタッコ	含有 アクチノライト 0.1%	17	浴室棟	外部	外壁	吹付タイル	含有せず
番号	建物	部位	材料	吹付け	含有率																																																																										
7	宿泊棟 (A棟)	外階段	天井	リシン吹付	含有 クリンタイト 0.9%																																																																										
8	宿泊棟 (A棟)	外部	外壁	吹付タイル	含有せず																																																																										
9	宿泊棟 (A棟)	外部	外壁	モルタルスタッコ	含有 アクチノライト 0.1%																																																																										
10	宿泊棟 (B棟)	外部	外壁	モルタルスタッコ	含有 アクチノライト 0.1%																																																																										
11	宿泊棟 (B棟)	出窓	外壁	吹付タイル	含有せず																																																																										
12	宿泊棟 (B棟)	出窓	上裏	吹付タイル	含有せず																																																																										
13	宿泊棟 (C棟)	出窓	壁	吹付タイル	含有せず																																																																										
14	宿泊棟 (C棟)	出窓	上裏	吹付タイル	含有せず																																																																										
15	宿泊棟 (C棟)	外部	外壁	モルタルスタッコ	含有 アクチノライト 0.1%																																																																										
16	浴室棟	外部	外壁	モルタルスタッコ	含有 アクチノライト 0.1%																																																																										
17	浴室棟	外部	外壁	吹付タイル	含有せず																																																																										


採取箇所

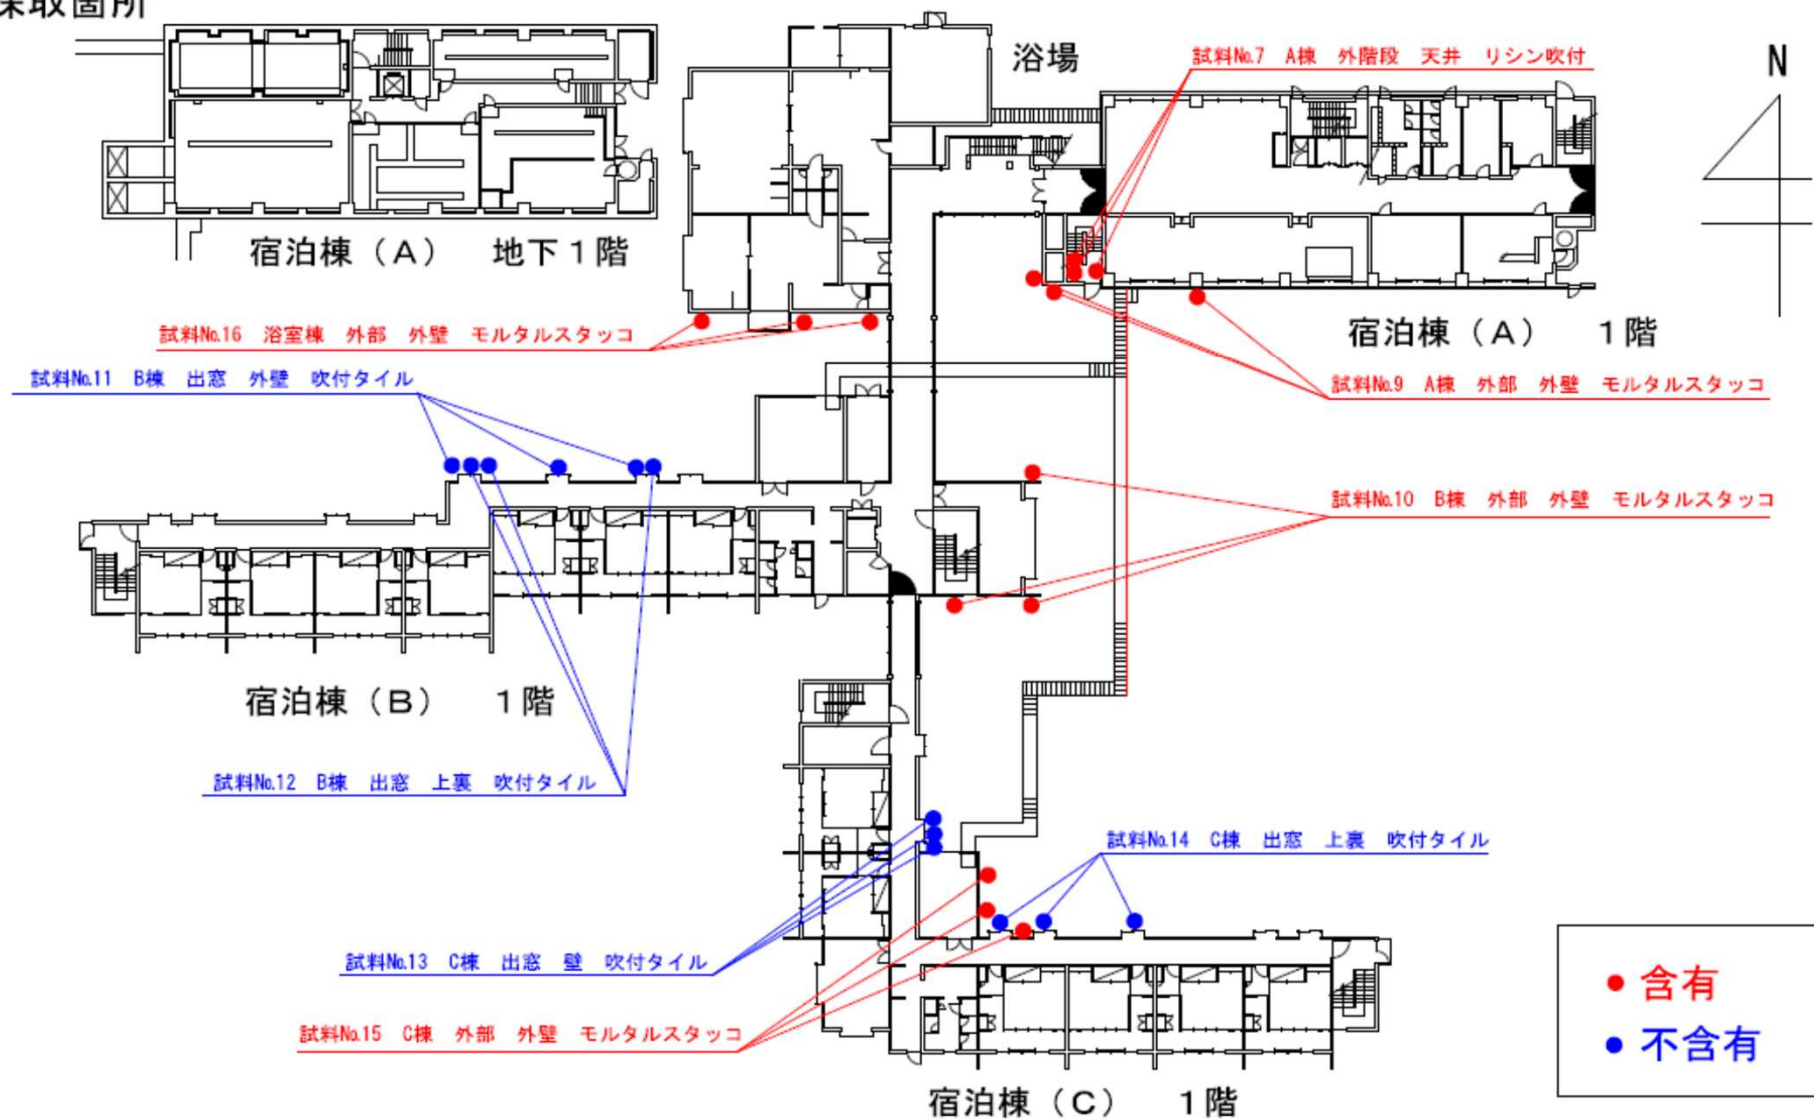

採取箇所



宿泊棟（A） 塔屋

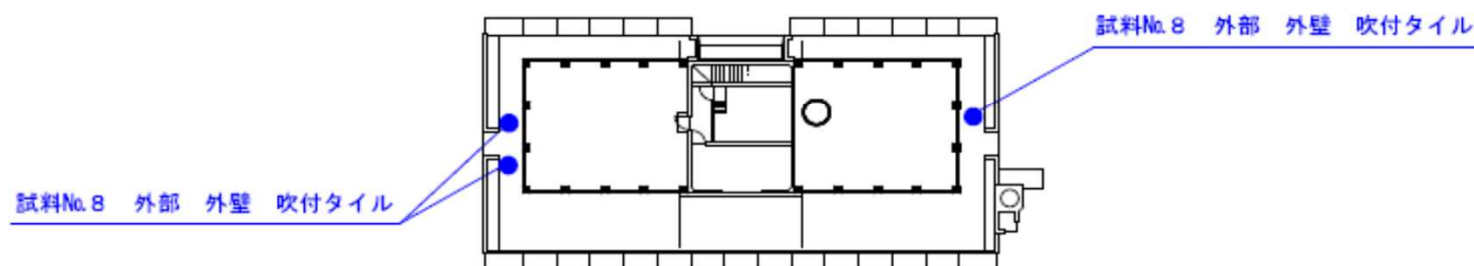

宿泊棟（A） 屋上



採取箇所

試料No.17 浴室棟 外部 外壁 吹付タイル

浴室棟屋上

宿泊棟 (A)

2階

宿泊棟 (B)

2階

宿泊棟 (C)

2階



- 含有
- 不含有

